



وثيقة متطلبات الأعمال

منصة الخدمات البلدية للمشاريع الكبرى

Giga-Projects Municipal Services Platform — Business Requirements Document

متطلبات الأعمال للبوابة الموحدة لتقديم الخدمات البلدية للمشاريع الكبرى في مدينة الرياض ومتابعتها، ومتطلبات تكاملها مع البوابة الرسمية لأمانة منطقة الرياض alriyadh.gov.sa.

الرقم المرجعي
RRM-GPO-BRD-2026-001

التصنيف
داخلي — مقيد التداول

التاريخ
8 أغسطس 2026 م

الإصدار
1.0 (مسودة للمراجعة)

§ ضبط الوثيقة

البند	التفصيل
عنوان الوثيقة	وثيقة متطلبات الأعمال – منصة الخدمات البلدية للمشاريع الكبرى
الرقم المرجعي	RRM-GPO-BRD-2026-001 · الإصدار 1.0 (مسودة) · 8 أغسطس 2026 م
مالك الأعمال	مكتب المشاريع الكبرى – أمانة منطقة الرياض
الأصول المرتبطة	نسخة عرض تجريبية تفاعلية (ثنائية اللغة)؛ المرجع التصميمي: البوابة الرسمية alriyadh.gov.sa
الحالة	مسودة معروضة للمراجعة – بانتظار اعتماد مكتب المشاريع الكبرى ووكالة التحول الرقمي بالأمانة ولجنة حوكمة البوابة

سجل الإصدارات

الإصدار	التاريخ	الوصف
0.9	28 يوليو 2026 م	مسودة أولى مبنية على النموذج التجريبي (نطاق المنصة، الأدوار، دليل الخدمات، نموذج المدد الزمنية، نموذج الأثر)
1.0	8 أغسطس 2026 م	إضافة متطلبات التكامل مع البوابة الرسمية، والهوية البصرية الموحدة، ومراحل التنفيذ ومعايير القبول

الاعتمادات (قيد الاستكمال)

الدور	الاسم	التوقيع	التاريخ
مدير مكتب المشاريع الكبرى	—		
رئيس التحول الرقمي	—		
حوكمة البوابة الرسمية (alriyadh.gov.sa)	—		

§ المحتويات

3	الملخص التنفيذي	1
3	الخلفية والسياق الاستراتيجي	2
4	أهداف الأعمال ومؤشرات النجاح	3
4	نطاق العمل	4
5	أصحاب المصلحة وأدوار المستخدمين	5
5	الوضع الراهن وبيان المشكلة	6
6	نظرة عامة على الحل المقترح	7

7	سجل متطلبات الأعمال	8
9	التكامل مع البوابة الرسمية alriyadh.gov.sa	9
11	المتطلبات غير الوظيفية	10
11	البيانات والتقارير ونموذج الأثر	11
12	الافتراضات والقيود والاعتماديات	12
12	المخاطر وسبل معالجتها	13
13	خارطة طريق التنفيذ	14
13	معايير القبول	15
14	الملاحق – شاشات النموذج التجريبي ومسرد المصطلحات	16

1 الملخص التنفيذي

تشهد مدينة الرياض واحدًا من أكبر برامج التطوير العمراني المنسقة في العالم؛ إذ تعتمد المشاريع الكبرى — كالدرعية والقدية والمربع الجديد ومطار الملك سلمان الدولي وإكسبو 2030 الرياض — على مئات القرارات البلدية، من القرارات المساحية واعتماد المخططات ورخص البناء إلى تسليم البنية التحتية والتصاريح البيئية ورخص التشغيل، وترتبط سرعة إنجاز هذه القرارات ارتباطًا مباشرًا بجداول تنفيذ تُقاس قيمتها بمليارات الريالات.

منصة الخدمات البلدية للمشاريع الكبرى بوابة موحدة ثنائية اللغة تتقدم من خلالها جهات المشاريع الكبرى والمطورون والمكاتب الهندسية والمستثمرون والمشغلون بجميع الخدمات البلدية ذات الصلة بمشاريعهم ويتابعونها، وفق مدد زمنية معلنة، وبمسار تصعيد منضبط، وسجل قرارات قابل للتدقيق، وقياس حي للأثر الاقتصادي المتحقق.

وقد بُني نموذج تجريبي تفاعلي كامل بهوية البوابة الرسمية alriyadh.gov.sa بوصف المنصة قسماً أصيلاً منها. وتوثّق هذه الوثيقة متطلبات الأعمال التي يجسدها النموذج، وتحدد متطلبات التكامل مع البوابة الرسمية: الإدراج ضمن قسم الخدمات الإلكترونية، والدخول الموحد (النفاذ الوطني وحسابات البوابة)، ونظام التصميم المشترك، والإشعارات الموحدة، وقناة 940، والاستضافة، والتحليلات، والتزامات الامتثال.

67%- التخفيض المستهدف في متوسط زمن الخدمة قياسًا بخطط الأساس قبل المنصة	5 رحلات رسمية متكاملة — التخطيط، البناء، المستثمر، التشغيل، الصناعية	38 خدمة بلدية موثقة بمددها الزمنية المعلنة (2- 28 يوم عمل)
--	---	---

2 الخلفية والسياق الاستراتيجي

رؤية المملكة 2030 وأجندة الرياض. تستهدف الاستراتيجية الوطنية أن تكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات مدن في العالم، مع مستهدفات سكانية تقارب 15 مليون نسمة، ومحفظة مشاريع كبرى تمتد عبر الثقافة والرياضة والطيران والإسكان والتجديد العمراني. ويقع التمكين البلدي — من تصاريح ومخططات وفحوصات ورخص — على المسار الحرج لهذه المحفظة.

مكتب المشاريع الكبرى. أنشأت الأمانة مكتب المشاريع الكبرى ليكون الجهة البلدية الواحدة المقابلة للمشاريع الكبرى: سجل موحد للمشاريع، ومسار أولوية لطلباتها، وقناة تصعيد واحدة للمعوقات العابرة للجهات (التحديات)، ولوحة قياس واحدة للالتزام الزمني والأثر.

الفجوة الرقمية. تتوزع هذه التعاملات اليوم على قنوات عامة لم تُصمم لحجم المشاريع الكبرى ولا لإلحاحها ولا لتنسيقها متعدد الجهات؛ فلا توجد نظرة موحدة لمسار المشروع البلدي، ولا مدد معلنة خاصة بالمشاريع الكبرى، ولا قياس للكلفة الاقتصادية للتأخير.

لماذا التكامل مع البوابة الرسمية؟ البوابة الرسمية هي الواجهة الأمامية للأمانة: فهي تحمل العلامة الموثوقة، ونظام التصميم الموحد، والدخول الوطني الموحد، وقناة 940، ومنظومة تطبيق مدينتي، وحوكمة المحتوى. وإطلاق المنصة قسماً من البوابة — لا موقعاً مستقلاً — يورثها هذه الثقة والبنية منذ اليوم الأول، ويحافظ على واجهة رقمية واحدة للمستفيدين.

3 أهداف الأعمال ومؤشرات النجاح

م	الهدف	مؤشر النجاح (المستهدف)
01	تقليل زمن الخدمات البلدية للمشاريع الكبرى	متوسط معالجة ≥ 8 أيام عمل (خط الأساس ≈ 25)؛ تخفيض على مستوى الدليل $\leq 60\%$
02	إصدار القرارات ضمن المدد المعلنة	الالتزام بالمدد $\leq 90\%$ ؛ الاستجابة الأولى $\geq$ يومي عمل
03	سرعة معالجة المعوقات العابرة للجهات	نسبة إغلاق التحديات $\leq 85\%$ ضمن المدة المحددة (15 يوم عمل)
04	إنجاز رقمي كامل بلا ورق	100% من الطلبات رقمية من التقديم إلى القرار؛ صفر مستندات ورقية
05	ثقة المتعاملين ورضاهم	رضا المتعاملين ≤ 4.2 من 5 يُقاس عند إغلاق كل طلب
06	إظهار الأثر وإخضاعه للمساءلة	نشر نموذج تكلفة التأخير بمنهجيته؛ لوحة أثر حية للمكتب والقيادة
07	واجهة واحدة عبر البوابة الرسمية	الوصول إلى المنصة واكتشافها من alriyadh.gov.sa بدخول موحد

4 نطاق العمل

4.1 داخل النطاق

- **القسم العام** (ضمن البوابة): صفحة المنصة الرئيسية بدليل الخدمات ورحلات المطور والمستثمر العقاري التفاعلية.
- **بوابة المستفيدين**: معالج تقديم موجه، متابعة «طلباني»، مخطط الرحلة بموقع التقدم الحي، إعادة التقديم، التحديات، الإشعارات، تقييم الرضا، الملف الشخصي والتفويض.
- **لوحة موظفي الأمانة**: قائمة فرز الطلبات، شاشة دراسة ثلاثية الألواح، التحقق من المستندات، الإحالات الخارجية، القرارات بشروطها وتوقيعها المزدوج، عدادات المدد والتصعيد.
- **الإدارة**: لوحة قيادة المكتب، سجل المشاريع، مؤشرات الأداء، التقارير، إدارة دليل الخدمات، سجل التدقيق، الإعدادات (العتل وسياسة المدد)، ولوحة «أثر المنصة».
- **الملخص التنفيذي**: عرض قيادي مختصر بأرقام الأثر وأبرز المستجدات الأسبوعية.
- **التكامل مع البوابة**: الهوية، والدخول، والاستضافة، والإشعارات، وقناة 940 والمحادثة، وتطبيق مدينتي، والبيانات المفتوحة، والتحليلات (القسم 9).

4.2 خارج النطاق (في هذه المرحلة)

- تنفيذ سداد الرسوم (التكامل مع سداد) — تُعرض الرسوم وتبقى التحصيلات على القنوات القائمة حتى المرحلة الثانية.
- التحقق الآلي من قطع الأراضي عبر نظم المعلومات الجغرافية وجدولة الفحص الميداني (المرحلة الثانية مع GIS الأمانة).
- التكاملات الآلية المباشرة مع الجهات الخارجية (المياه، الكهرباء، البيئة) بما يتجاوز مسار الإحالات — المرحلة الثانية عبر قناة التكامل الحكومية.
- الخدمات البلدية العامة لغير المشاريع الكبرى — تبقى ضمن الخدمات الإلكترونية القائمة في البوابة.

حالة النموذج التجريبي. يعرض البناء الحالي التجربة كاملة ببيانات افتراضية على مخزن بيانات محلي بحكم التصميم، وطبقة البيانات فيه واجهة مستودع قابلة للاستبدال، بحيث تستبدل المرحلة الأولى التخزين بخدمات إدارة العلاقات (CRM) وواجهات REST لدى الأمانة دون تغيير في واجهة الاستخدام.

5 أصحاب المصلحة وأدوار المستخدمين

الدور	الوصف	أبرز الصلاحيات
ممثل المشروع	مستخدم مخوّل عن مشروع مسجل. الشخصيات: ممثل جهة مشروع كبير، مطور عقاري، مكتب هندسي (بالتفويض)، مستثمر، مشغل.	تقديم الطلبات ومتابعتها، الرحلات، التحديات، التقييم، نطاق التفويض
أخصائي الدراسة بالأمانة	يدرس الطلبات المسندة إليه ضمن المدد؛ يتحقق من المستندات؛ يحيل خارجيًا؛ يعدّ القرارات.	قائمة العمل، شاشة الدراسة، الإعادة، الإحالات، مسودات القرار
مدير المنصة / مكتب المشاريع الكبرى	رئيس القسم بالمكتب؛ يملك الدليل والمدد والتصعيد والتقارير؛ يوقّع القرارات الحساسة توقيفًا مزدوجًا.	اللوحات، سجل المشاريع، المؤشرات، الأثر، الدليل والإعدادات، التدقيق
مراجع الجهة الخارجية	يستقبل إحالات محددة النطاق (كالمرافق والبيئة) ويعيد المراثيات ضمن مدة الإحالة.	وارد الإحالات، الرد بالمراثيات والاشتراطات
المطالع التنفيذي	القيادة؛ يطلع على الملخصات فقط.	الملخص التنفيذي، أرقام الأثر، الموجز القابل للطباعة

أصحاب مصلحة آخرون: لجنة حوكمة البوابة الرسمية، وكالة التحول الرقمي بالأمانة، شركات المشاريع الكبرى، الجهات الحكومية الخارجية، هيئة الحكومة الرقمية (المعايير)، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (الضوابط).

6 الوضع الراهن وبيان المشكلة

نقطة الألم	الأثر على الأعمال
لا مسار موحدًا لطلبات المشاريع الكبرى؛ فهي تصطف مع عموم المعاملات	تصاريح المسار الحرج تنتظر خلف معاملات اعتيادية؛ انزلاق جداول برامج بمليارات الريالات
مدد غير معلنة لكل خدمة؛ ولا عدادات حية أو نطاقات تصعيد	غياب المساءلة الزمنية؛ نزاعات حول المدد المنقضية؛ مفاجآت بدل الإنذار المبكر
المعوقات العابرة للجهات بلا مالك ولا مسار عمل	نقل خدمات المرافق والموافقات يتعثر شهوياً؛ لا سجل للسبب ولا للمعالجة
متطلبات المستندات تُكتشف بالتجربة والتكرار	ارتفاع نسب الإعادة وإعادة التقديم؛ دورات دراسة مهدرة
لا نظرة على مستوى المشروع لمساره البلدي	لا الجهة ولا المكتب يرى جميع ما يعوق المشروع في لوحة واحدة
تكلفة التأخير غير مرئية	يتعذر بناء حالة الاستثمار لتحسين الإجراءات؛ وتمر المكاسب دون قياس

7 نظرة عامة على الحل المقترح

منصة واحدة، وخمس تجارب، وعمود بيانات واحد:

الوحدة	وظيفتها
دليل الخدمات	38 خدمة موثقة عبر دورة حياة المشروع – قبل التطوير (التخطيط والقرارات المساحية والمخططات العامة)، وأثناء التنفيذ (رخص البناء والهدم، تصميم البنية التحتية وتسليمها، التصاريح البيئية للإنشاء، وتصاريح التمكين كالرافعات البرجية وسياج المواقع وإغلاق الطرق وتصريف المياه ونقل خدمات المرافق)، وبعد الإنجاز (رخص التشغيل والأنشطة، الامتثال الدوري، التجديد). تنشر كل خدمة غرضها ومتطلباتها المسبقة ومستنداتها المطلوبة بصيغها المقبولة ونموذج رسومها والجهات الداعمة ومدتها بأيام العمل.
رحلات المطور والمستثمر	خمس رحلات رسمية تُعرض مخططًا تفاعليًا من محطات متصلة (متعرج على سطح المكتب وعمود رأسي على الهاتف): التخطيط (7 خطوات وثلاثة مسارات لاعتماد المخطط)، البناء (5)، المستثمر (6)، التشغيل وإدارة الأصول (7)، الصناعية (5). يرى المستفيد الموقع دخول موقع مشروعه الفعلي («أنت هنا») ومحطاته المكتملة والمتعرجة، ويبدأ أي خدمة من محطاتها.
معالج تقديم الطلب	تقديم موجّه مع تحقق: اختبار المشروع والمرحلة، نماذج ديناميكية لكل خدمة، رفع مستندات بفحص الصيغ، خطوة مراجعة وإقرار، مسودات، ورقم تتبع عند التقديم.
محرك دورة الحياة	اثنتا عشرة حالة من المسودة إلى الإغلاق بانتقالات مضبوطة بالأدوار؛ عدادات مدد على تقويم الأحد-الخميس مع العطل الرسمية؛ يتوقف العداد عند إعادة الطلب للمستفيد؛ نطاقات تصعيد (أخضر/كهرماني/أحمر) مع تصعيد آلي للمكتب عند التجاوز؛ مسار أولوية يخفض المدد إلى النصف لجهات المشاريع الكبرى؛ قاعدة التوقيع المزدوج للقرارات ذات الرسوم أو مسار الأولوية؛ وترقيم للتصاريح عند الاعتماد.
شاشة الدراسة	شاشة أخصائي بثلاثة ألواح: ملخص الطلب وعداد المدة؛ قائمة تحقق المستندات؛ ولوح القرار (اعتماد/إعادة/رفض/إحالة) بالشروط والمرجع النظامي والقوالب.
التحديات	تسجيل منظم للمعوقات العابرة للجهات مرتبطًا بالمشروع وبالطلب اختياريًا؛ فئات، وإسناد مالك، ومدة، وتصعيد لتنسيق المكتب، وسجل معالجة.
أثر المنصة	نموذج تكلفة التأخير يُحسب حيًا من الطلبات المنجزة: أيام العمل الموفرة قياسًا بخطوط الأساس، والوفر المالي التقديري بالريال، والقيمة الاستثمارية المسرّعة، والمساهمة التقديرية في الناتج المحلي، والوظائف المدعومة – سجل أثر لكل طلب، وإفصاح كامل عن المنهجية، ووسم أمين يفرق بين التقديري والمُقاس (القسم 11).
التقارير والتدقيق	محرك مؤشرات (زمن المعالجة، الالتزام بالمدد، الاستجابة الأولى، الإنجاز في الوقت، إغلاق التحديات، الرضا)، واتجاهات أسبوعية، وموجز تنفيذي قابل للطباعة، وسجل تدقيق كامل للإجراءات الإدارية والقرارات.
طبقة التجربة	عربية أولاً من اليمين ليسار مع مرآة إنجليزية كاملة؛ نظام تصميم البوابة الرسمية (القسم 9)؛ إتاحة الوصول وتهيئة الهواتف؛ لوحة أوامر؛ وتخصيص للمظهر والكثافة وحجم الخط.

8 سجل متطلبات الأعمال

تتبع الأولويات منهجية MoSCoW: **أ** أساسي • **م** مهم • **ت** تحسيفي. وجميع المتطلبات أدناه مجسدة في النموذج التجريبي ما لم يُذكر خلاف ذلك.

8.1 القسم العام ودليل الخدمات

المعرف	المتطلب	الأولوية
BR-001	تعرض الصفحة العامة دليل الخدمات بتبويبات مرحلية (الكل / قبل التطوير / أثناء التنفيذ / بعد الإنجاز) وبحث نصي حر، وبطاقة تفصيلية لكل خدمة تبين المتطلبات المسبقة والمستندات المطلوبة وصيغها وملاحظة الرسوم والجهات الداعمة والمدة.	أ
BR-002	تعرض الصفحة العامة الرحلات الرسمية الخمس بوصفها مخططًا متصلًا للاطلاع؛ ويقود اختبار الرحلة إلى تسجيل الدخول ثم المخطط التفاعلي الكامل.	أ
BR-003	تتاح كل صفحة عامة بالعربية (افتراضيًا، من اليمين لليسار) وبالإنجليزية بمحتوى مكافئ.	أ

8.2 بوابة المستفيدين

المعرف	المتطلب	الأولوية
BR-010	يقدم ممثل المشروع الموقع دخوله أي خدمة من الدليل عبر معالج موجه بنماذج ديناميكية لكل خدمة، ورفع مستندات يُتحقق من صيغها المعلنة، خطوة مراجعة وإقرار نظامي؛ وتُحجب التقديمات غير المكتملة برسائل خطأ قابلة للتنفيذ.	أ
BR-011	تُحفظ المسودات وتُستأنف؛ ويتلقى الطلب المقدم رقم تتبع فريدًا ويظهر في «طلباتي» بحالته وعدّاد مدته وسكة تقدمه الكلية.	أ
BR-012	يُسقط مخطط الرحلة طلبات المستفيد الفعلية على محطات الرحلة (مكتملة / قيد التنفيذ / بانتظار إجراء / قادمة)، ويعلم المحطة الحالية، ويتيح إجراءات على مستوى المحطة (بدء الطلب، إكمال المسودة، عرض الطلب/القرار).	أ
BR-013	عند إعادة الطلب يرى المستفيد الأسباب والنواقص ويعدل ويعيد التقديم؛ ويظهر توقف عداد المدة أثناء انتظار إجراء المستفيد بوضوح.	أ
BR-014	يسجل المستفيدون التحديات مرتبطة بمشروع/طلب مع الفئة والوصف، ويتابعون معالجتها.	أ
BR-015	عند الإغلاق يُدعى المستفيد لتقييم رضاه (1-5) مع تعليق اختياري؛ وتغذي التقييمات المؤشر الخامس.	م
BR-016	تعمل المكاتب الهندسية ضمن نطاق تفويض صريح وظاهر يقتصر على الخدمات المخولة.	م

8.3 الموظفون والقرارات

المعرف	المتطلب	الأولوية
BR-020	يعمل الأخصائيون من قائمة مرتبة بالأولوية (الوارد / طلباتي / قرارات مستحقة / معادة) بحسب إلحاح المدد، مع تمييز بصري لطلبات مسار الأولوية.	أ
BR-021	تجمع شاشة الدراسة الملخص والمستندات والقرار معًا؛ ويُتحقق من كل مستند على حدة (قبول / ملاحظة) قبل القرار.	أ

أ	تُضبط القرارات المتاحة بالحالة والدور: إعادة للأسباب، إحالة خارجية بالنطاق والموعد، اعتماد بشروط اختيارية، رفض بمرجع نظامي. ويتطلب اعتماد الأخصائي للخدمات ذات الرسوم أو مسار الأولوية توقيماً مزدوجاً من المكتب.	BR-022
أ	تنشئ الإحالة الخارجية مهمة محددة النطاق للجهة الخارجية بمدتها الخاصة؛ ويعرض الطلب الأصل حالة الإحالة والمرئيات العائدة.	BR-023
أ	يصدر عن الاعتماد وثيقة قرار/تصريح مرقمة؛ وتُقيّد جميع القرارات في سجل التدقيق بالفاعل والوقت والمحتوى.	BR-024
أ	تُصدّد تجاوزات المدد آلياً إلى لوحة المكتب؛ ويحمل كل تجاوز بيان سببه (الأيام المنقضية مقابل المتوقعة).	BR-025

8.4 الإدارة والدليل والإعدادات

المعرف	المتطلب	الأولوية
BR-030	يدير المكتب سجل المشاريع (تسجيل، تمكين، إيقاف، أرشفة) بالقطاع والمرحلة والموقع وتصنيف «مشروع كبير».	أ
BR-031	يدير المكتب دليل الخدمات: تعديل أيام المدد وأهلية مسار الأولوية بأثر تدقيقي؛ وتسري التعديلات على الطلبات الجديدة فقط.	أ
BR-032	تعرض اللوحات مؤشرات حية بمقارنة زمنية، واتجاهات أسبوعية للتقديم والقرار، وتفصيلات بالخدمة والقطاع، مع نفاذ إلى الطلبات المكوّنة.	أ
BR-033	تحكم الإعدادات تقويم العمل (عطلة الأسبوع والعطل الرسمية) المعتمد في كل حسابات المدد.	أ
BR-034	موجز تنفيذي قابل للطباعة يلخص المؤشرات وأرقام الأثر والتوصيات للقيادة.	م

9 التكامل مع البوابة الرسمية alriyadh.gov.sa

تُطلق المنصة قسماً أصيلاً من البوابة الرسمية. وقد نُفذ النموذج التجريبي الهوية البصرية للبوابة من طرف إلى طرف (بقياسات من الموقع الحي: اللوحة اللونية، تشريح الترويسة، سلم الخط، هندسة المكونات). وتكمل المتطلبات أدناه التكامل التشغيلي.

9.1 الإدراج والتنقل

المعرف	المتطلب	الأولوية
IR-001	تتاح المنصة من قائمة «الخدمات الإلكترونية» ومركز الخدمات في البوابة باسم «خدمات المشاريع الكبرى»، مع إبراز في صفحة الخدمات الإلكترونية.	أ
IR-002	تكون الاستضافة القانونية تحت نطاق البوابة — المسار alriyadh.gov.sa/giga-services (أو النطاق الفرعي giga.alriyadh.gov.sa) خلف طبقة حافة البوابة (TLS) وجدار التطبيقات وشبكة التوزيع؛ ولا يظهر للمستخدم أي نطاق لطرف ثالث.	أ
IR-003	تُدرج كل خدمة من الدليل في دليل خدمات البوابة برابط عميق يفتح معالج المنصة على الخدمة نفسها (مثال: .../giga-services#/wizard?service=building-permit).	أ
IR-004	تعرض المنصة إطار البوابة الموحد: الشريط العلوي، الترويسة والقائمة، مسار التنقل (الرئيسية ← الخدمات الإلكترونية ← خدمات المشاريع الكبرى)، وتذييل البوابة — من حزمة نظام تصميم البوابة لا نسخاً مكرراً.	أ

9.2 الهوية والدخول

المعرف	المتطلب	الأولوية
IR-010	يكون دخول المستخدمين عبر النفاذ الوطني الموحد (نفاذ) وحسابات البوابة القائمة؛ ويرتبط ممثل المنشأة بمشروع مسجل عبر تخويل يعتمده مكتب المشاريع الكبرى.	أ
IR-011	يتحد دخول الموظفين مع موافق هوية الأمانة المستخدم لبريد الموظفين (دخول موحد وتحقق متعدد العوامل)؛ وتُسند أدوار المنصة إلى مجموعات إدارة الهوية (أخصائي، مدير المكتب، مراجع خارجي، تنفيذي).	أ
IR-012	يصل مراجعو الجهات الخارجية عبر قناة الربط الحكومي أو حسابات اتحادية محددة النطاق، ويقتصر وصولهم على إحالاتهم.	أ
IR-013	تتبع الجلسات والموافقات وإشعارات الخصوصية سياسة البوابة ومتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية.	أ

9.3 القنوات والخدمات المحيطة بالمنصة

المعرف	المتطلب	الأولوية
IR-020	تُسلّم الإشعارات (التقديم، تغير الحالة، الإعادة، القرار، التصعيد) عبر بوابة الإشعارات الموحدة — رسائل نصية وبريد وصندوق وارد بالبوابة — وبلغه المستفيد.	أ
IR-021	يستطيع مركز الاتصال 940 ومحادثة «تحدث معنا» الاستعلام عن الطلب برقم التتبع وتسجيل تحدّي نيابة عن المستفيد.	أ
IR-022	يوفر تطبيق «مدينتي» روابط عميقة إلى متابعة الطلب؛ وتعكس إشعارات الدفع بوابة الإشعارات الموحدة.	م
IR-023	تُنشر مؤشرات مجمعة مجهولة الهوية (الأحجام، الالتزام بالمدد، أرقام الأثر الرئيسية) في قسم البيانات المفتوحة بدورية شهرية.	م
IR-024	تتدفق تحليلات الاستخدام إلى تحليلات البوابة الموحدة؛ وتسهم المنصة في إحصائيات البوابة.	م

أ	يُحكم المحتوى العام (أوصاف الخدمات ونصوص الرحلات) عبر مسار محتوى البوابة، ثنائي اللغة، ومكتب المشاريع الكبرى مالمًا للمحتوى.	IR-025
---	--	--------

9.4 تكاملات المنصة مع الأنظمة الأساسية (المرحلتان 1-2)

الأولوية	المتطلب	المعرف
أ	تُستبدل طبقة المستودع في النموذج بخدمات إدارة العلاقات وإدارة الحالات لدى الأمانة عبر REST خلف الواجهة نفسها (الطلبات، المشاريع، المستندات، القرارات، الإشعارات) – فعقد واجهة الاستخدام مبني على المحوّلات أصلاً.	IR-030
أ	ينتقل تخزين المستندات إلى نظام إدارة الوثائق بالأمانة مع الفحص الأمني وسياسة الاحتفاظ وسلامة الإثبات.	IR-031
م	تسير الإحالات الخارجية عبر قناة التكامل الحكومية حيثما توفرت تكاملات الجهات؛ ويبقى مسار الإحالة اليدوي احتياطًا.	IR-032
م	تتكامل الخدمات ذات الرسوم مع سداد عند القرار (المرحلة الثانية)؛ وحتى ذلك الحين تُعرض ملاحظات الرسوم وتبقى التحصيلات على القنوات القائمة.	IR-033
ت	تستهلك خريطة المشاريع طبقات نظم المعلومات الجغرافية بالأمانة لحدود المشاريع (المرحلة الثانية) بدل الخريطة التمثيلية.	IR-034

10 المتطلبات غير الوظيفية

المعرف	الفئة	المتطلب
NFR-01	اللغة	عربية أولاً من اليمين لليسار مع مرآة إنجليزية كاملة؛ كل عنوان وإشعار ووثيقة بلغتين؛ التاريخان الهجري والميلادي وفق عرف البوابة.
NFR-02	إتاحة الوصول	مستوى WCAG 2.1 AA: مسارات مكتملة بلوحة المفاتيح، تركيز مرئي، دعم تقليل الحركة، لوحة ألوان مدققة التباين، معالم لقارئ الشاشة (النموذج يطبق هذه الأنماط).
NFR-03	الأداء	أول عرض ذي معنى ≥ 3 ثوانٍ على نطاق عريض قياسي؛ التفاعلات ≥ 200 ملي ثانية؛ بناء الإنتاج مقسم الجزم (الملف الواحد خيار تغليف للنموذج).
NFR-04	التجاوب	وظائف كاملة من هواتف 390 بكسل إلى سطح المكتب؛ أهداف لمس ≤ 40 بكسل؛ لا انزياح أفقي.
NFR-05	الإتاحة	99.9% شهرياً للوظائف المواجهة للمستخدم؛ نوافذ الصيانة وفق سياسة البوابة.
NFR-06	الأمن	الضوابط الأساسية للأمن السبراني (الهيئة الوطنية)؛ OWASP ASVS L2: سجل تدقيق كامل؛ أدوار بأدنى صلاحية؛ استضافة البيانات داخل المملكة (نظام حماية البيانات الشخصية).
NFR-07	قابلية التدقيق	كل تغيير حالة وإجراء إداري منسوب (مَن/مَتى/ماذا) ومحفوظ به وفق سياسة السجلات.
NFR-08	المتصفحات	أحدث إصدارين من كروم وإيدج وسفاري وفايرفوكس؛ وWebView على iOS وأندرويد عبر تطبيق مدينتي.

11 البيانات والتقارير ونموذج الأثر

تقيس المنصة نفسها بنفسها: ستة مؤشرات تشغيلية تُحسب حياً (متوسط زمن المعالجة، الالتزام بالمدد، زمن الاستجابة الأولى، نسبة الإنجاز في الوقت شاملة الطلبات المفتوحة، إغلاق التحديات، الرضا)، إضافة إلى **نموذج أثر اقتصادي** يحوّل الوقت الموفر إلى قيم مالية وفق منهجية «تكلفة التأخير»:

- تحمّل كل خدمة خط أساس موثقاً لمدتها قبل المنصة؛ ويحمل كل مشروع قيمة استثمارية استرشادية ومعامل كلفة تأخير يومية؛ وتحمل كل خدمة وزناً على المسار الحرج.
- لكل طلب معتمد: $\text{الأيام الموفرة} = \text{خط الأساس} - \text{صافي أيام العمل الفعلية}$ ؛ $\text{الوفر} = \text{الأيام الموفرة} \times \text{قيمة المشروع} \times \text{المعامل اليومي} \times \text{وزن المسار الحرج}$ ؛ وتُشتق القيمة المسرّعة ومساهمات الناتج والوظائف من معاملات اقتصادية قياسية.
- يُوسم كل رقم بأنه **تقديري** (نمذجة) أو **مُقاس** (رصد مباشر)؛ وتُنشر المنهجية كاملة داخل المنتج، ويجعل سجل الأثر لكل طلب الأرقام الرئيسية قابلة للتدقيق.

في بيئة الإنتاج تُستبدل خطوط الأساس وقيم المشاريع والمعاملات ببيانات معتمدة رسمياً، ويُراجع النموذج من الوظيفة الاقتصادية بالأمانة قبل أي نشر خارجي (انظر R-05).

12 الافتراضات والقيود والاعتماديات

المعرف	البيان
A-01	نموذج تشغيل مكتب المشاريع الكبرى (جهة مقابلة واحدة، مسار أولوية، مدد معلنة) سياسة معتمدة قبل الإطلاق.
A-02	تسقي جهات المشاريع الكبرى ممثلين مخولين وتقبل التقديم الرقمي حصراً.
A-03	تمنح حوكمة البوابة المنصة قسماً ضمن «الخدمات الإلكترونية» ونفاذاً إلى حزمة نظام التصميم.
C-01	تُستضاف جميع بيانات الإنتاج داخل المملكة، ولا شبكات توزيع خارجية ولا متبوعات خارج أدوات البوابة المعتمدة.
C-02	تتقيد تعريفات المدد بالأنظمة؛ فالمنصة تنشرها وتقيسها ولا تتجاوز الحدود الزمنية النظامية.
D-01	تهيئة نفاذ والدخول الموحد، واتحاد هوية الأمانة، وبوابة الإشعارات الموحدة، وبيئات إدارة العلاقات والوثائق، والربط الحكومي – بملكية وكالة التحول الرقمي.
D-02	تحديث نصوص 940 والمحادثة للتعرف على أرقام تتبع المنصة.

13 المخاطر وسبل معالجتها

المعرف	الخطر	الأثر	المعالجة
R-01	إعلان المدد قبل الجاهزية التشغيلية	مرتفع	إطلاق تجريبي مع جهتين رائدتين؛ ونشر مدد كل موجة خدمات بعد أسبوعين أخضرين
R-02	عدم التزام الجهات الخارجية بمدد الحالات	مرتفع	التصعيد للجنة تنسيق المكتب مبني في المسار؛ وتقارير أداء الحالات بحسب الجهة
R-03	انزلاق جدول التكمالات (الدخول/ العلاقات/الوثائق)	متوسط	تسمح بنية المحوّلات بتجربة مستضافة بالبوابة بهوية مؤقتة ريثما تكتمل التكمالات
R-04	إرباك المستفيدين بازدواجية القنوات أثناء الانتقال	متوسط	سياسة الواجهة الواحدة: دليل البوابة يرتبط حصراً بالمنصة لخدمات المشاريع الكبرى؛ والقنوات السابقة تعيد التوجيه
R-05	اقتباس أرقام الأثر خارجياً دون سياقها	متوسط	وسم تقديري/مُقاس، ونشر المنهجية، واعتماد الوظيفة الاقتصادية قبل أي استخدام خارجي
R-06	انحراف المحتوى بين دليل البوابة ودليل المنصة	منخفض	الدليل مصدر وحيد؛ ومدخلات دليل البوابة تولّد منه (IR-003 و IR-025)


14 خارطة طريق التنفيذ

مستمرة	≈ 6 أشهر	≈ 3 أشهر	مكتملة
المرحلة 3 – التوسع والتحسين	المرحلة 2 – التكاملات الأساسية	المرحلة 1 – الإطلاق على البوابة	المرحلة 0 – النموذج التجريبي
جهات وخدمات إضافية؛ شد المدد من الأداء المقاس؛ تنبؤ بأعباء العمل؛ مساندة صياغة للأخصائيين؛ وتقرير أثر سنوي.	إتاحة الدليل كاملاً (38 خدمة)؛ رسوم سداد؛ إحالات الربط الحكومي لأولى الجهات؛ طبقات GIS؛ روابط مدينتي؛ تغذية البيانات المفتوحة؛ وضم جميع المشاريع الكبرى المسجلة.	الاستضافة تحت alriyadh.gov.sa ؛ نفاذ ودخول الموظفين؛ استبدال المخزن التجريبي بمحوّلات العلاقات والوثائق؛ الإشعارات الموحدة؛ استعلام 940 والمحاذئة؛ حوكمة المحتوى؛ تجربة مع جهتين وموجة 12 خدمة.	عرض تفاعلي كامل: 38 خدمة، 5 رحلات، محرك دورة الحياة، شاشات العمل، اللوحات، نموذج الأثر، هوية البوابة، ثنائية اللغة، وتهيئة الهواتف.


15 معايير القبول (بوابة المرحلة الأولى)

المعرف	المعيار
AC-01	يسجل ممثل جهة رائدة دخوله عبر نفاذ من alriyadh.gov.sa ، ويقدم طلب رخصة بناء رقميًا من طرف إلى طرف، ويتلقى رقم التتبع عبر الرسائل والبريد صندوق البوابة.
AC-02	يعالج أخصائي الطلب في شاشة الدراسة ضمن المدة؛ ويرى المستفيد كل تغير حالة بعدد حي؛ وتوقف الإعادة العداد حتى إعادة التقديم.
AC-03	يتطلب الاعتماد ذو الرسوم أو مسار الأولوية توقيعًا مزدوجًا من المكتب وبقيدته، ويصدر وثيقة قرار مرقمة تُحفظ في نظام الوثائق.
AC-04	يُصدّد تجاوز المدة آليًا ويظهر في لوحة المكتب ببيان سببه؛ ويظهر تحدُّ سجل عبر 940 في وحدة التحديات.
AC-05	يُعرض القسم داخل إطار البوابة، ويجتاز فحوص WCAG 2.1 AA على المسارات الرئيسة، ويعمل كاملاً بالعربية والإنجليزية من هاتف 390 بكسل إلى سطح المكتب.
AC-06	تُحسب لوحنا المؤشرات والأثر من بيانات التجربة الحية؛ ويتتبع كل رقم رئيس إلى قيود سجله لكل طلب.

16 الملحق (أ) – شاشات النموذج التجريبي

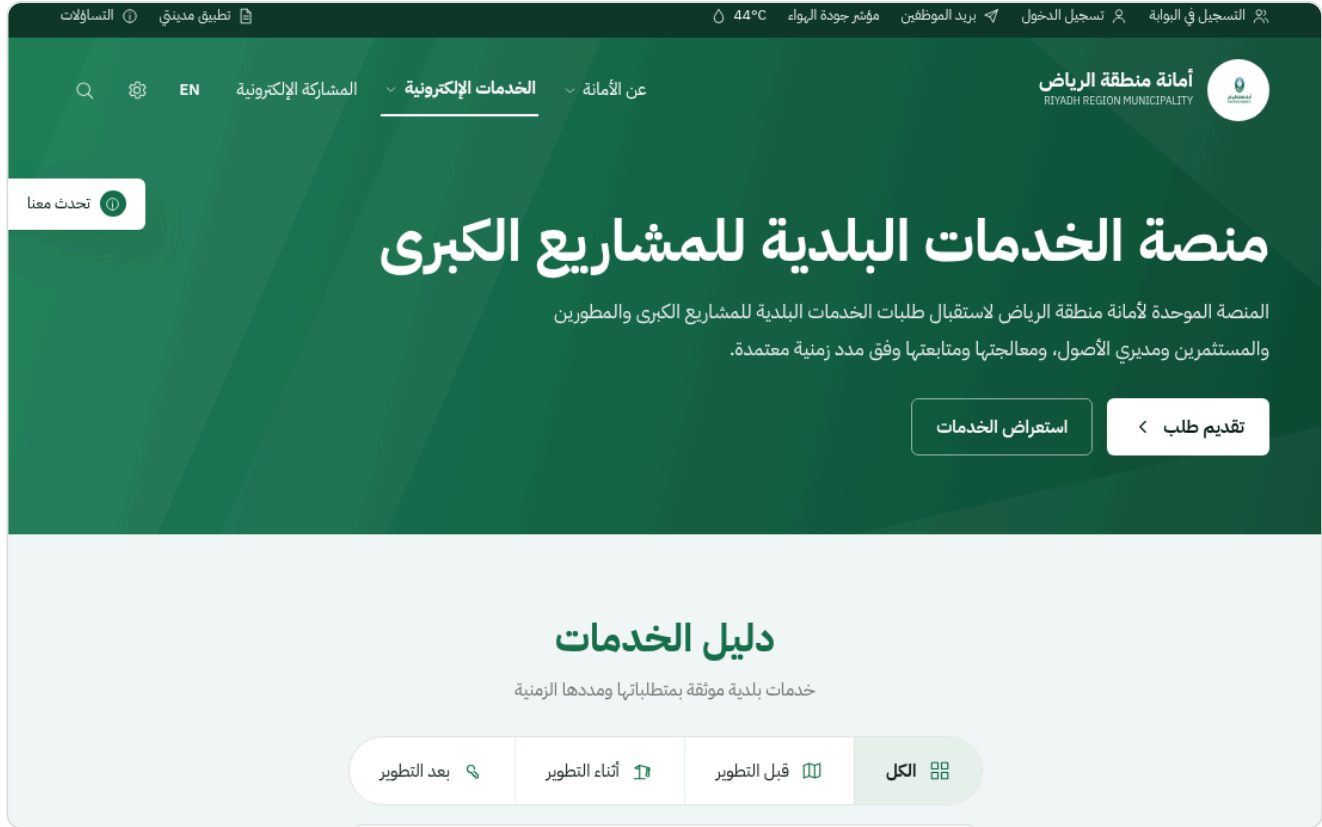


أ-1 – القسم العام بهوية البوابة الرسمية: الشريط العلوي، ترويسة البوابة مع تفعيل «الخدمات الإلكترونية»، ودليل الخدمات بتبويباته المرحلية.

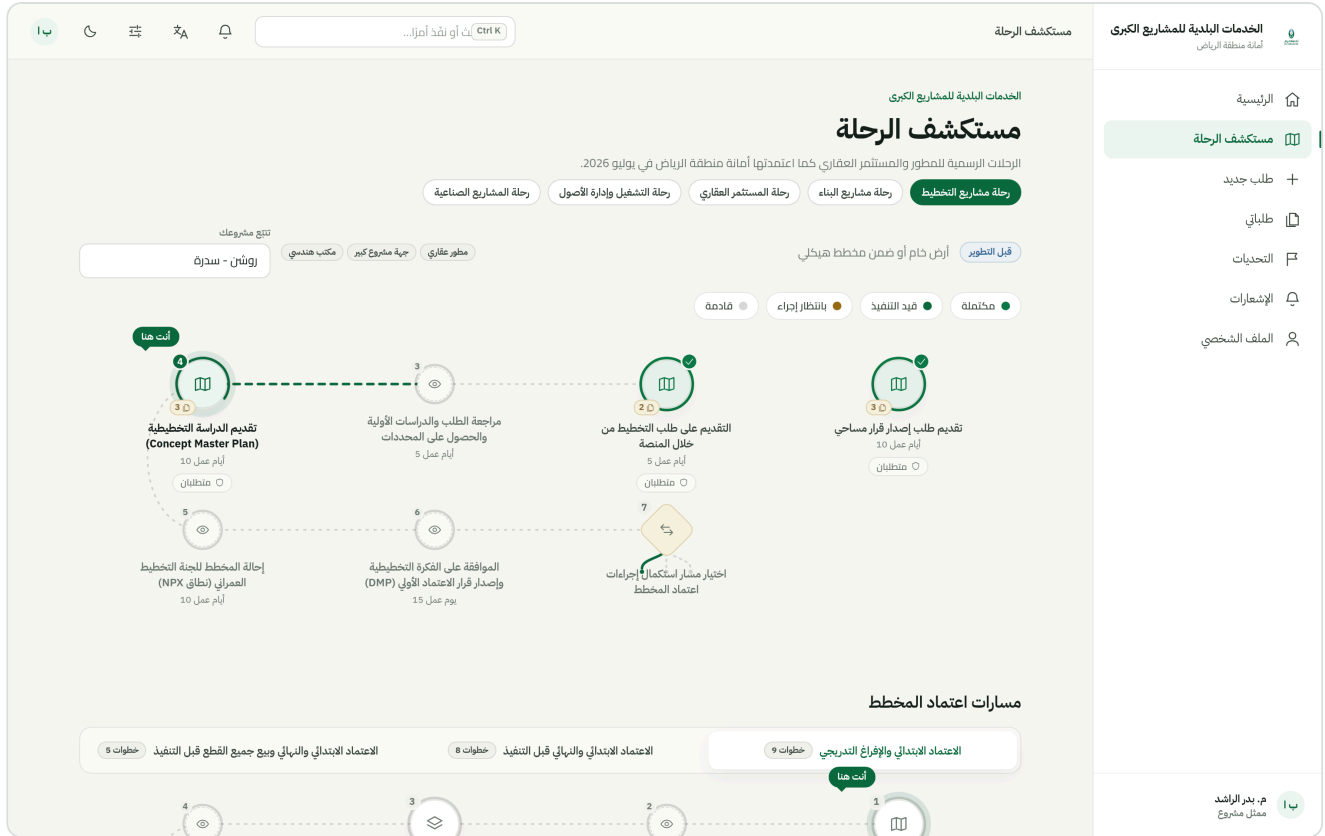

أ-2 - مخطط الرحلة: رحلة التخطيط بحالات محطاتها الحية المسقطة من طلبات مشروع المستفيد، وموقعه الحالي («أنت هنا»)، ومسارات اعتماد المخطط الثلاثة.

16 الملحق (أ) – شاشات النموذج التجريبي (تتمة)

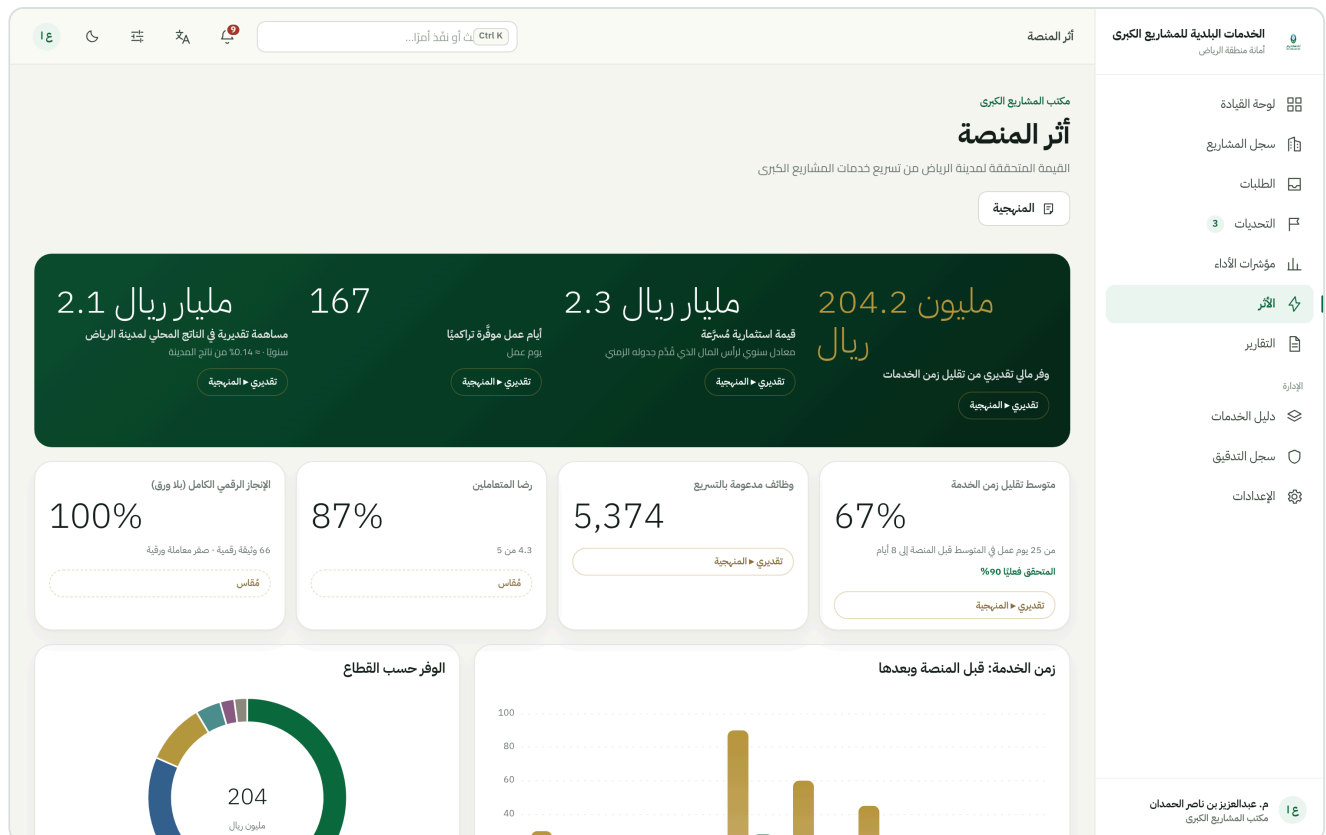

أ-3 – لوحة «أثر المنصة»: أرقام تكلفة التأخير الرئيسية، ووسم تقديري/مُقاس، والتفصيل القطاعي، وسجل الأثر لكل طلب.

الملحق (ب) – مسرد المصطلحات

المصطلح	التعريف
الأمانة	أمانة منطقة الرياض.
مكتب المشاريع الكبرى (GPO)	الجهة البلدية الواحدة المقابلة للمشاريع الكبرى.
المدة الزمنية المعلنة (SLA)	مدة الخدمة المنشورة بأيام العمل (الأحد-الخميس، دون العطل الرسمية).
مسار الأولوية	مسار مقدَّم لطلبات جهات المشاريع الكبرى في الخدمات المؤهلة؛ تُخفّض مدته إلى النصف وتُوفَّق قراراته توقيفًا مزدوجًا.
التحدي	قيد منظم لمعوق عابر للجهات يملكه مكتب المشاريع الكبرى حتى معالجته.
نفاذ	خدمة النفاذ الوطني الموحد للدخول.
قناة التكامل الحكومية (GSB)	القناة الوطنية للربط بين الجهات الحكومية.
نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)	النظام السعودي لحماية البيانات الشخصية.
نموذج تكلفة التأخير	تقييم كل يوم عمل موفَّر بنسبة من قيمة المشروع المتأثر موزونة بوزن الخدمة على مساره الحرج.

إخلاء مسؤولية النموذج التجريبي. تستخدم النسخة التجريبية المرافقة مشاريع وطلبات ومستخدمين وأرقامًا افتراضية، وليست الموقع الرسمي لأمانة منطقة الرياض، ولا يشكل أي رقم فيها إحصاءً رسميًا.
